



臺北自來水事業處

推薦優良水池水塔清洗廠商服務報告書

臺北市立?公國中

服務廠商：順登工程行

通報編號：B108080395

中華民國108年09月17日



讓您生活更美好

### 用水設備改善建議表

勾選v	建議改善項目	說明
	2. 自來水系統與消防系統管線連結	當逆止閥故障時，易造成消防水逆流而污染飲用水。(詳消防污染防制說帖或改善圖說)
	3. 蓄水池/水塔龜裂或漏水	水質易遭污水入滲，而影響用水品質。
	4. 蓄水池、水塔周邊或頂部堆置雜物或積水	易孳生蚊、蟲或積水滲入，而影響環境及飲用水衛生。
	5. 污水管通過蓄水池內部或上方	當污水管滲漏，污水將入侵水池而造成污染。
	6. 蓄水池池壁與外牆未隔離，或位於地板下與污水池或化糞池相鄰	當池壁龜裂，易遭污水滲入而造成污染。
	7. 蓄水池、水塔三極棒或揚水管孔洞未密閉	易遭污物、蟲蚊或污水入侵而污染水質。
	8. 人孔蓋 未密閉/破損/無蓋/未上鎖	易導致污物或污水入侵而污染飲用水。
	9. 人孔突緣未提高或破損	易遭積水污水入侵而污染水質。
	10. 人孔蓋/沉水幫浦/爬梯/鋼筋或配件嚴重銹蝕	產生銹水，影響用水品質及維護作業之安全。
	11. 溢排管通氣管防蟲網 未設/無倒U/破損	蟲、蚊及蟑螂等易沿此入侵，影響用水水質。
	12. 未經蓄水池直接由進水管線使用馬達直接抽水	當水壓不足或停水時，易吸入污水而造成水質污染。
	13. 蓄水池、水塔容量過大，且洗前餘氯<0.1mg/L	自來水滯留過久，易變質而影響飲用水衛生。
	14. 其他:	

## 用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱： 順登工程行

檢查日期： 108年08月24日

<b>基本資料</b>	臺北市信義區福德街221巷15號					連絡人		吳小姐	
	場所名稱		臺北市立?公國中		e-mail		電話		2786-7561
水池5座，總計170噸；水塔6座，總計110噸；									
<b>水池設備檢查</b>	位置樓層		棟別或地點： <u>至善樓#1</u> 編號： <u>A</u> (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) <input type="checkbox"/> 1樓地面 <input checked="" type="checkbox"/> 地下層 <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	結構材質		<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP						
	容量		容量：L <u>0</u> W <u>0</u> H <u>0</u> (m) <u>30</u> 噸						
	周圍狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下(*請參照說明1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與汙水池或化糞池相鄰						
	結構體		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備						
	頂部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	人孔狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽						
	溢排管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管						
	通氣管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管						
內部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕							
<b>水塔設備檢查</b>	位置樓層		棟別或地點： <u>至直樓</u> 編號： <u>1</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)						
	結構材質		<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP						
	容量		容量：L <u>0</u> W <u>0</u> H <u>0</u> (m) <u>15</u> 噸						
	周圍狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	結構體		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備						
	頂部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	人孔狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽						
	溢排管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管						
通氣管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氯氣	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	<input type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 (*請參照說明2)
清洗前	水池	2019/08/24	09:45	-	-	-	-	-	
	水塔	2019/08/24	09:38	-	-	-	-	-	
清洗後	水池	2019/08/24	17:45	0.32	7.1	69	0.51	-	
	水塔	2019/08/24	17:38	0.26	7.1	69	0.54	-	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氯氣符合水質標準；「+」表示氯氣不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。							
建議改善事項					用戶簽章			廠商簽章	教育訓練合格人員
									證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第\_\_頁；共\_\_頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

<p>(至善樓#1)水池A清洗前</p>	<p>(至善樓#1)水池A清洗後</p>
	
<p>(至真樓)水塔1清洗前</p>	<p>(至真樓)水塔1清洗後</p>
	



## 用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表




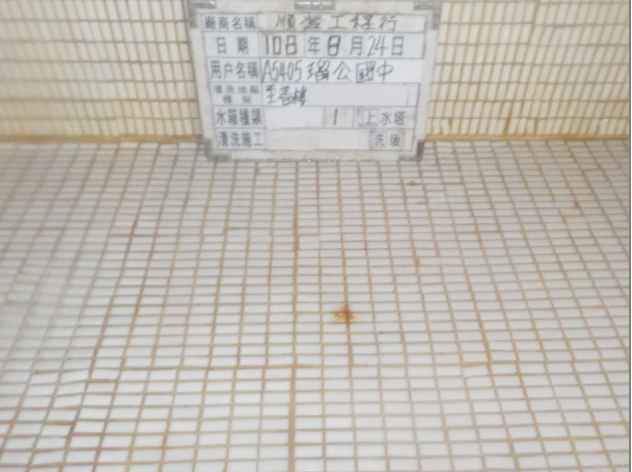
廠商名稱： 順登工程行

檢查日期： 108年08月24日

<b>基本資料</b>	臺北市信義區福德街221巷15號					連絡人		吳小姐	
	場所名稱		臺北市立?公國中		e-mail		電話		2786-7561
水池5座，總計170噸；水塔6座，總計110噸；									
<b>水池設備檢查</b>	位置樓層		棟別或地點： _____ 編號： <b>B</b> (編號以英文字母表示如：A、B、C...Z) <input type="checkbox"/> 1樓地面 <input checked="" type="checkbox"/> 地下層 <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	結構材質		<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP						
	容量		容量：L <u>0</u> W <u>0</u> H <u>0</u> (m) <u>30</u> 噸						
	周圍狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下(*請參照說明1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與汙水池或化糞池相鄰						
	結構體		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備						
	頂部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	人孔狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽						
	溢排管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管						
	通氣管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管						
內部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕							
<b>水塔設備檢查</b>	位置樓層		棟別或地點： <b>至善樓#1</b> 編號： <b>2</b> (編號以阿拉伯數字表示如：1、2、3...10)						
	結構材質		<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP						
	容量		容量：L <u>0</u> W <u>0</u> H <u>0</u> (m) <u>15</u> 噸						
	周圍狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	結構體		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備						
	頂部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	人孔狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽						
溢排管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
通氣管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氯氣	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	<input type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 (*請參照說明2)
清洗前	水池	2019/08/24	09:45	-	-	-	-	-	
	水塔	2019/08/24	09:40	-	-	-	-	-	
清洗後	水池	2019/08/24	17:45	0.32	7.1	68	0.54	-	
	水塔	2019/08/24	17:40	0.23	7.1	68	0.43	-	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氯氣符合水質標準；「+」表示氯氣不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。							
建議改善事項					用戶簽章			廠商簽章	教育訓練合格人員
									證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第\_\_頁；共\_\_頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

<p>( )水池B清洗前</p>	<p>( )水池B清洗後</p>
	
<p>(至善樓#1)水塔2清洗前</p>	<p>(至善樓#1)水塔2清洗後</p>
	

## 用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱： 順登工程行



檢查日期： 108年08月24日

基本資料	臺北市信義區福德街221巷15號					連絡人		吳小姐	
	場所名稱		臺北市立?公國中		e-mail	電話		2786-7561	
水池5座，總計170噸；水塔6座，總計110噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>至美樓</u> 編號： <u>C</u> (編號以英文字母表示如：A. B. C... Z) <input type="checkbox"/> 1樓地面 <input checked="" type="checkbox"/> 地下層 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量：L <u>0</u> W <u>0</u> H <u>0</u> (m) <u>30</u> 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下(*請參照說明1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與汙水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：_____ 編號： <u>3</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1. 2. 3... 10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量：L _____ W <u>0</u> H <u>0</u> (m) <u>15</u> 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽							
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氯氣	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池	2019/08/24	09:51	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 (*請參照說明2)
	水塔	2019/08/24	09:44	-	-	-	-	-	
清洗後	水池	2019/08/24	17:51	0.29	7.1	68	0.52	-	
	水塔	2019/08/24	17:44	0.29	7.1	68	0.45	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氯氣符合水質標準；「+」表示氯氣不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項					用戶簽章		廠商簽章		教育訓練合格人員
									證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第\_\_頁；共\_\_頁)。



水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

<p>(至美樓)水池C清洗前</p>	<p>(至美樓)水池C清洗後</p>
	
<p>( )水塔3清洗前</p>	<p>( )水塔3清洗後</p>
	



## 用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱： 順登工程行

檢查日期： 108年08月24日

<b>基本資料</b>	臺北市信義區福德街221巷15號					連絡人		吳小姐	
	場所名稱		臺北市立?公國中		e-mail		電話		2786-7561
水池5座，總計170噸；水塔6座，總計110噸；									
<b>水池設備檢查</b>	位置樓層		棟別或地點： _____ 編號： <b>D</b> (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) <input type="checkbox"/> 1樓地面 <input checked="" type="checkbox"/> 地下層 <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	結構材質		<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP						
	容量		容量：L <u>  </u> W <u>  </u> Q <u>  </u> H <u>  </u> Q (m) 40 噸						
	周圍狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下(*請參照說明1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與汙水池或化糞池相鄰						
	結構體		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備						
	頂部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	人孔狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽						
	溢排管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管						
	通氣管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管						
內部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕							
<b>水塔設備檢查</b>	位置樓層		棟別或地點： _____ 編號： <b>4</b> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)						
	結構材質		<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP						
	容量		容量：L <u>  </u> W <u>  </u> Q <u>  </u> H <u>  </u> Q (m) 25 噸						
	周圍狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	結構體		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備						
	頂部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	人孔狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽						
溢排管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
通氣管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氯氣	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	<input type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 (*請參照說明2)
清洗前	水池	2019/08/24	09:56	-	-	-	-	-	
	水塔	2019/08/24	09:51	-	-	-	-	-	
清洗後	水池	2019/08/24	17:56	0.33	7.1	67	0.53	-	
	水塔	2019/08/24	17:51	0.25	7.1	66	0.42	-	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氯氣符合水質標準；「+」表示氯氣不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項					用戶簽章			廠商簽章	教育訓練合格人員
									證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第\_\_頁；共\_\_頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

<p>( )水池D清洗前</p>	<p>( )水池D清洗後</p>
	
<p>( )水塔4清洗前</p>	<p>( )水塔4清洗後</p>
	

## 用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱： 順登工程行

檢查日期： 108年08月24日

基本資料	臺北市信義區福德街221巷15號					連絡人		吳小姐	
	場所名稱		臺北市立?公國中		e-mail	電話		2786-7561	
水池5座，總計170噸；水塔6座，總計110噸；									
水池設備檢查	位置樓層		棟別或地點： _____ 編號： <b>E</b> (編號以英文字母表示如：A. B. C... Z) <input type="checkbox"/> 1樓地面 <input checked="" type="checkbox"/> 地下層 <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	結構材質		<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP						
	容量		容量：L <u>  </u> W <u>  </u> Q <u>  </u> H <u>  </u> Q (m) 40 噸						
	周圍狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下(*請參照說明1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與汙水池或化糞池相鄰						
	結構體		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備						
	頂部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	人孔狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽						
	溢排管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管						
	通氣管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管						
內部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層		棟別或地點： _____ 編號： <b>5</b> (編號以阿拉伯數字表示如：1. 2. 3... 10)						
	結構材質		<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP						
	容量		容量：L <u>  </u> W <u>  </u> Q <u>  </u> H <u>  </u> Q (m) 15 噸						
	周圍狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	結構體		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備						
	頂部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____						
	人孔狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽						
溢排管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
通氣管		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氯氣	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	<input type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 (*請參照說明2)
清洗前	水池	2019/08/24	09:59	-	-	-	-	-	
	水塔	2019/08/24	09:51	-	-	-	-	-	
清洗後	水池	2019/08/24	17:59	0.34	7.1	67	0.54	-	
	水塔	2019/08/24	17:51	0.27	7.1	68	0.50	-	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氯氣符合水質標準；「+」表示氯氣不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項					用戶簽章			廠商簽章	教育訓練合格人員
									證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第\_\_頁；共\_\_頁)。



水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

<p>( )水池E清洗前</p>	<p>( )水池E清洗後</p>
	
<p>( )水塔5清洗前</p>	<p>( )水塔5清洗後</p>
	



## 用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱： 順登工程行

檢查日期： 108年08月24日

基本資料	臺北市信義區福德街221巷15號					連絡人 吳小姐			
	場所名稱	臺北市立?公國中	e-mail			電話	2786-7561		
水池5座，總計170噸；水塔6座，總計110噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： _____ 編號： _____ (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) <input type="checkbox"/> 1樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 __ 層 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量：L __ W __ H __ (m) __ 噸							
	周圍狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下(*請參照說明1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與汙水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： _____ 編號： 6 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量：L __ W __ H __ (m) 25 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氯氣	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	<input type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 (*請參照說明2)
清洗前	水池								
	水塔	2019/08/24	09:58	-	-	-	-	-	
清洗後	水池								
	水塔	2019/08/24	17:58	0.25	7.1	66	0.42	0.77	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氯氣符合水質標準；「+」表示氯氣不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章			廠商簽章	教育訓練合格人員
									證號：

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第\_\_頁；共\_\_頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

<p>( )水池清洗前</p>	<p>( )水池清洗後</p>
	
<p>( )水塔6清洗前</p>	<p>( )水塔6清洗後</p>
	
